

平成24年 第4回定例会

工事請負金額1,000万円以上の契約締結についての報告

平成24年 8月 1日から

平成24年10月31日まで

厚生文教委員会

番号	契約 番号	契約締結日	契 約 件 名	契 約 金 額 (円)	工 期	工 事 概 要	契約方法	進捗率(%)
			契 約 業 者 名					
1	4021-0	平成24年 8月 8日	小金井市総合体育館大規模改修工事 アートテクノ(株)	¥13,335,000	平成24年 8月 9日から 平成25年 2月28日まで	工事概要 1 建築工事 2 空調設備工事 3 電気設備工事	制限付一般 競争入札4 者	30

進捗率は、平成24年11月1日現在

小金井市総合体育館大規模改修工事

小金井市管内図

厚生文教委員会

西東京市

小平市

国分寺市

武蔵野市

三鷹市

府中市

調布市



- 凡例
- 小金井市道
  - ( ) 旧路線番号
  - 卍 神社
  - 卍 仏閣
  - 十 教会・修道院
  - 甲 病院

平成18年4月1日現在

1:110,000  
300M 1000M

工事請負金額1,000万円以上の契約締結についての報告

平成24年 8月 1日から

平成24年10月31日まで


建設環境委員会

番号	契約番号	契約締結日	契約件名	契約金額(円)	工期	工事概要	契約方法	進捗率(%)
			契約業者名					
1	4024-0	平成24年8月8日	市道1号線道路補修工事  新興産土木(株)	¥24,885,000	平成24年 8月 9日から 平成24年10月19日まで	施工延長 L=337.9m 切削オーバーレイ工(本線車道部) A=1715㎡ 路面切削工(排水処理層部) A= 59㎡ 低騒音アスファルト舗装工(本線車道部) A=1774㎡ 低騒音アスファルト舗装工(排水処理層部) A= 59㎡ 切削オーバーレイ工(交差点部) A= 480㎡ アスファルト舗装工(支道巻込部) A= 98㎡ アスファルト舗装工(街きよ間部) A= 28㎡ 半たわみ性舗装工(バス停) A= 63㎡ コンクリート削孔工(街きよ用集水桝) N= 44孔 人孔調整工(MR2-AB工法、鉄蓋支給品) N= 23箇所 人孔調整工(高さ調整、鉄蓋支給品) N= 1箇所 区画線設置工 1式 雑工(クラック抑制シート敷設工、歩道止石補修工) 1式	制限付一般競争入札3者	100
2	4327-0	平成24年8月29日	都市計画道路3・4・14号線管きよ新設・既設管等撤去工事  関建設工業(株)	¥15,109,500	平成24年 8月30日から 平成24年11月30日まで	管きよ工 強化プラスチック複合管 φ700 27.8m 可とう継手 4箇所 組立2号マンホール設置工 1箇所 内副管取付工 700×300 1箇所 人孔蓋調整工 受枠交換 1箇所 取付管布設工 1式 既設管撤去工 1式 付帯工 1式	制限付一般競争入札1者	30
3	4562-0	平成24年9月11日	JR中央本線まちづくり側道(市道787号線)街路築造工事  金澤建設(株)	¥61,530,000	平成24年 9月12日から 平成25年 3月21日まで	施工延長 L=458.6m アスファルト舗装工(総厚40型) 2,446㎡ アスファルト舗装工(総厚19型) 768㎡ 浸透トレンチ管工 845.9m L形用浸透ます設置工 49箇所 街きよ工(1025型) 835.1m 境石工 456.4m 境界標杭設置 35箇所 区画線工 1.0式 歩道照明設置工 20箇所 雑工 1.0式	制限付一般競争入札2者	10
4	4591-0	平成24年9月12日	雨水浸透桝設置工事(その2)  金澤建設(株)	¥18,900,000	平成24年 9月13日から 平成24年12月14日まで	雨水桝新設工 1式 雨水浸透管きよ工 50基 雨水桝取付管設置工 1式 付帯工 1式	指名競争入札8者	5

進捗率は、平成24年11月1日現在

# 小金井市管内図

建設環境委員会

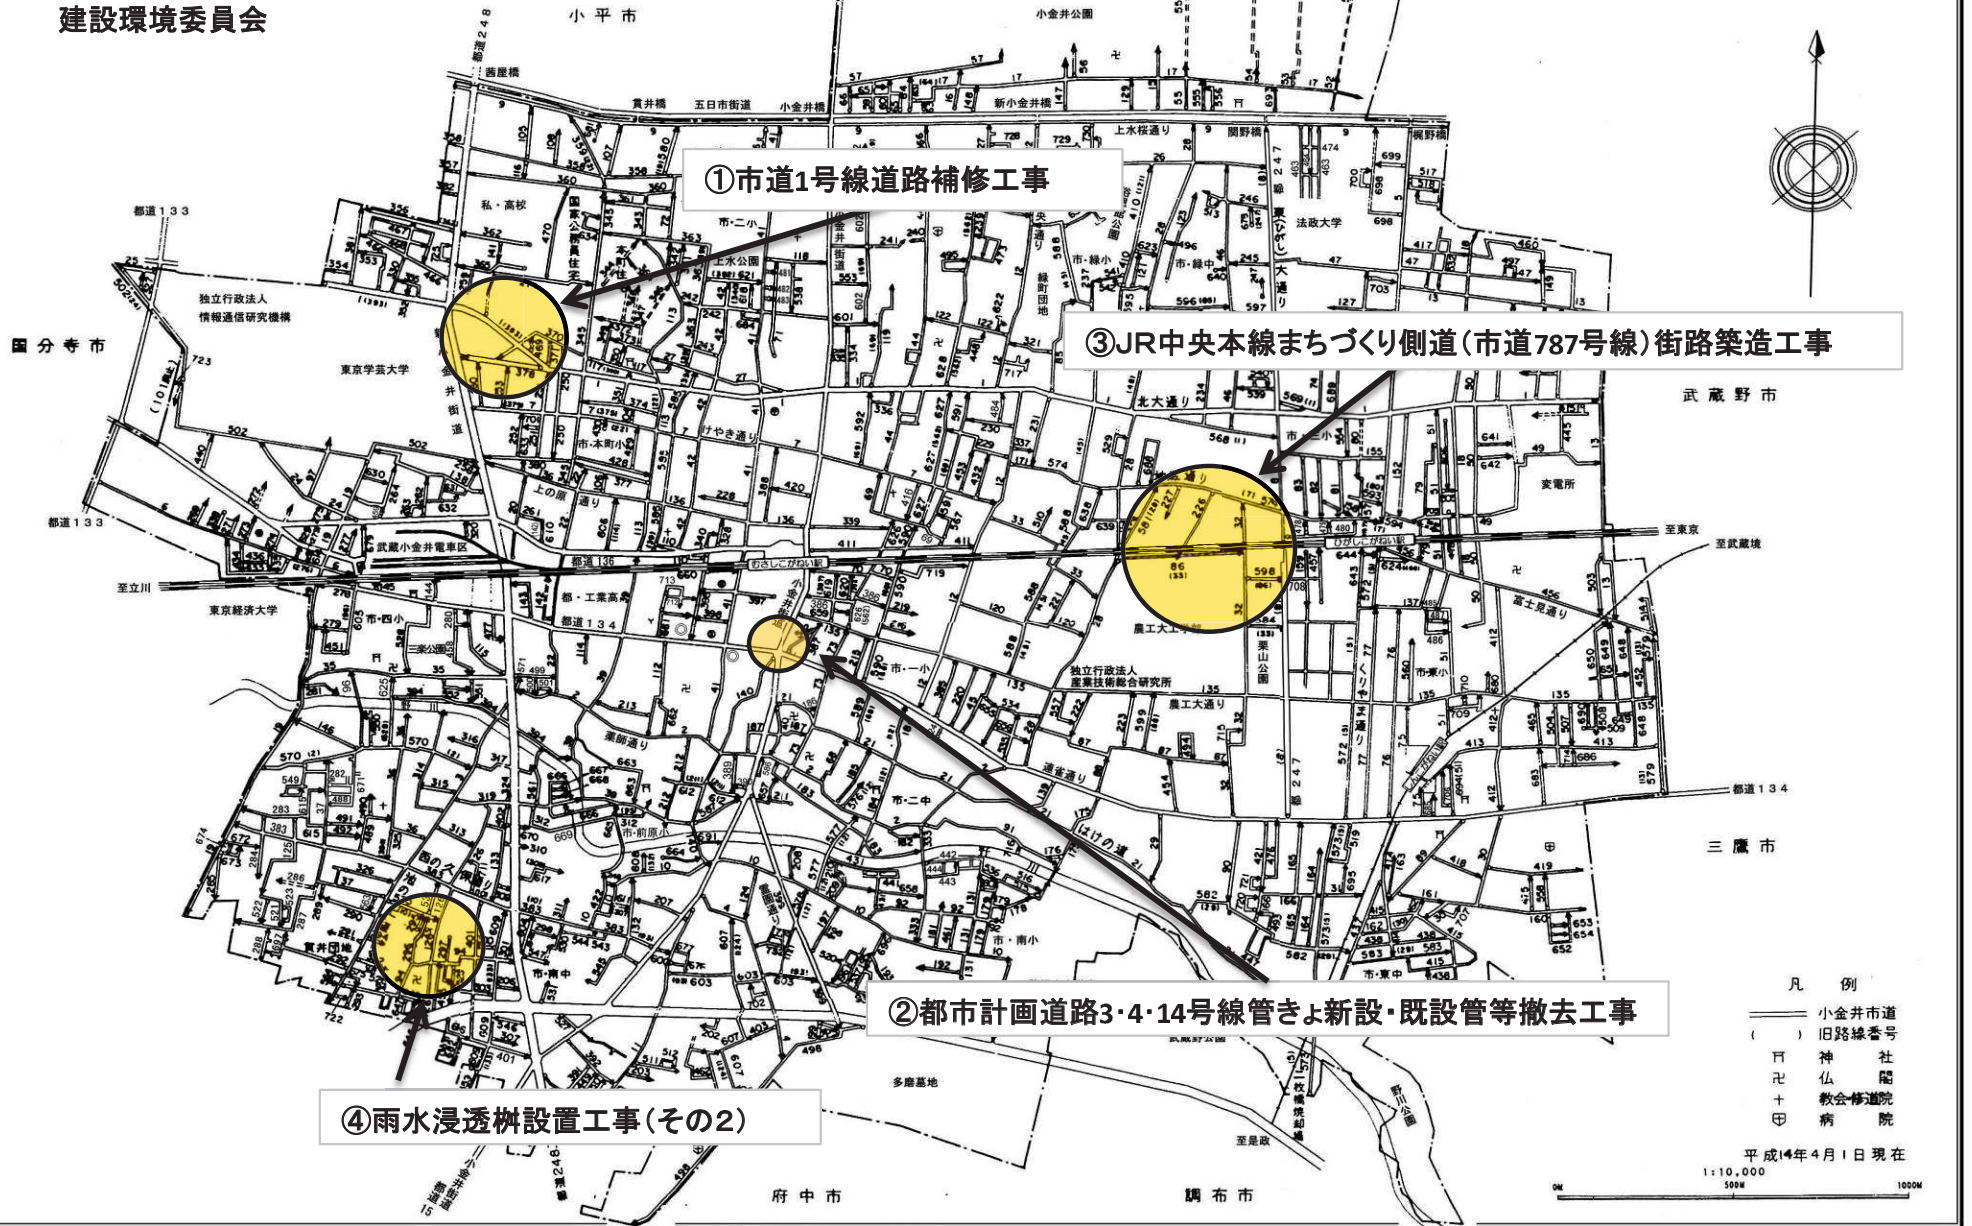

①市道1号線道路補修工事

③JR中央本線まちづくり側道(市道787号線)街路築造工事

②都市計画道路3・4・14号線管きよ新設・既設管等撤去工事

④雨水浸透柵設置工事(その2)

- 凡例
- 小金井市道
  - ( ) 旧路線番号
  - 卍 神社
  - 卍 仏閣
  - 十 教会
  - 卍 病院

平成14年4月1日現在  
1:10,000
